




1 nLight - CAISSE TYPE 0
Design 2

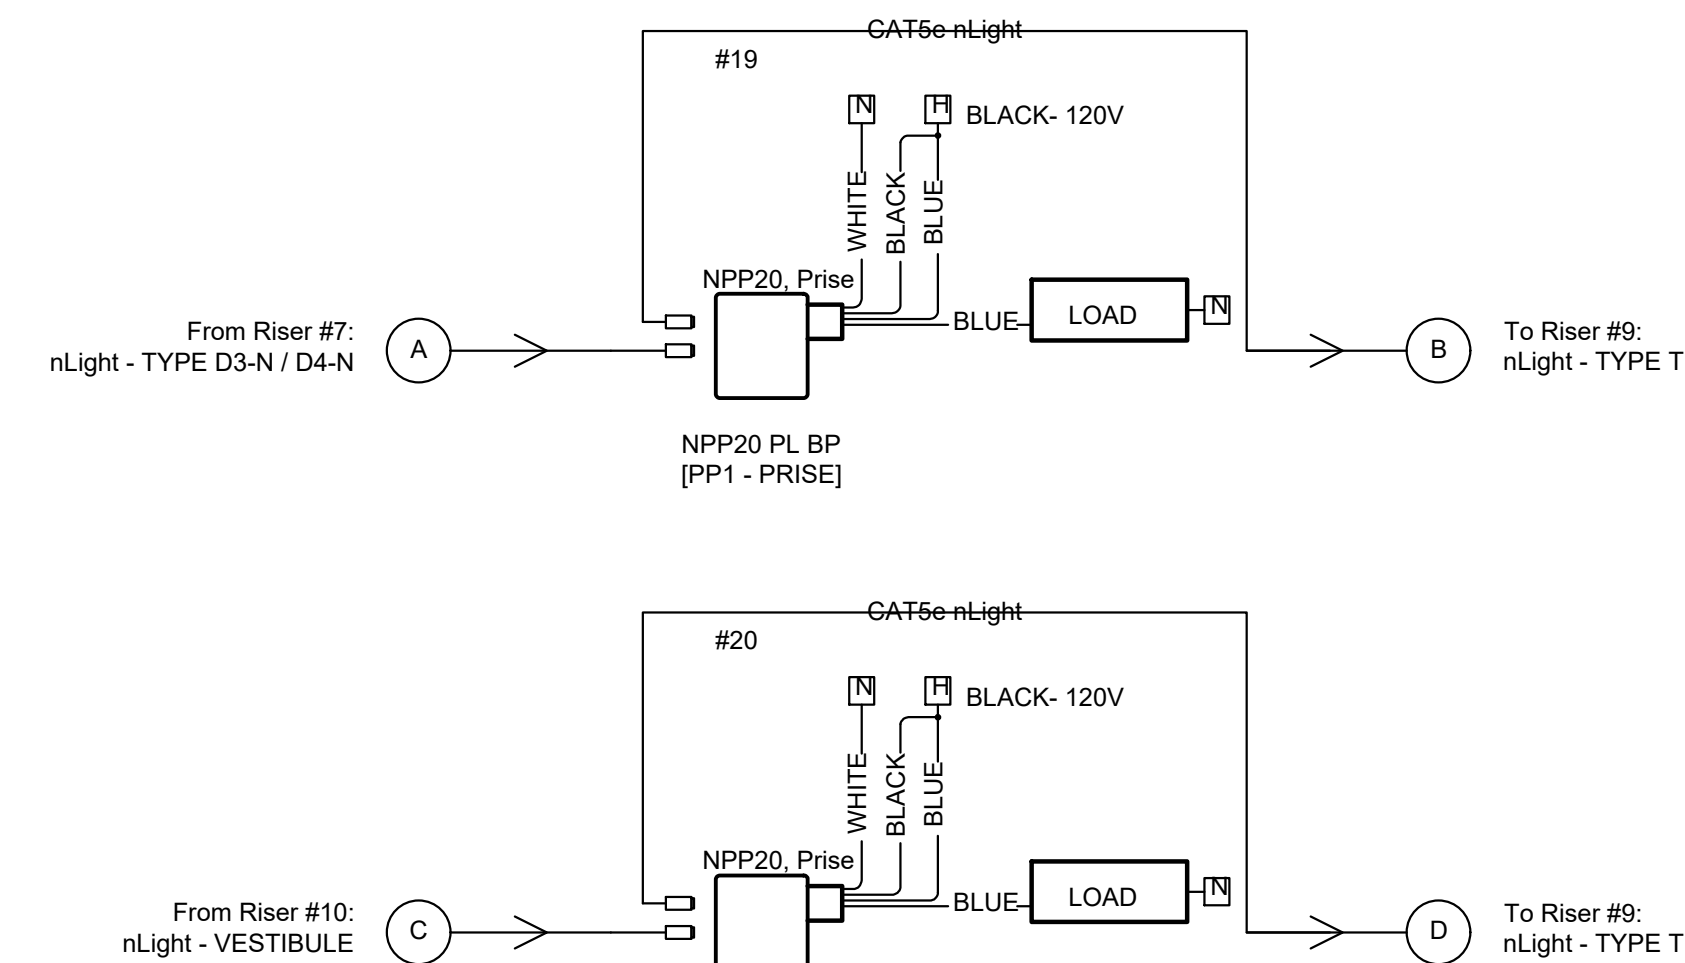

2 nLight - CAISSE TYPE D3-N / D4-N
Design 2

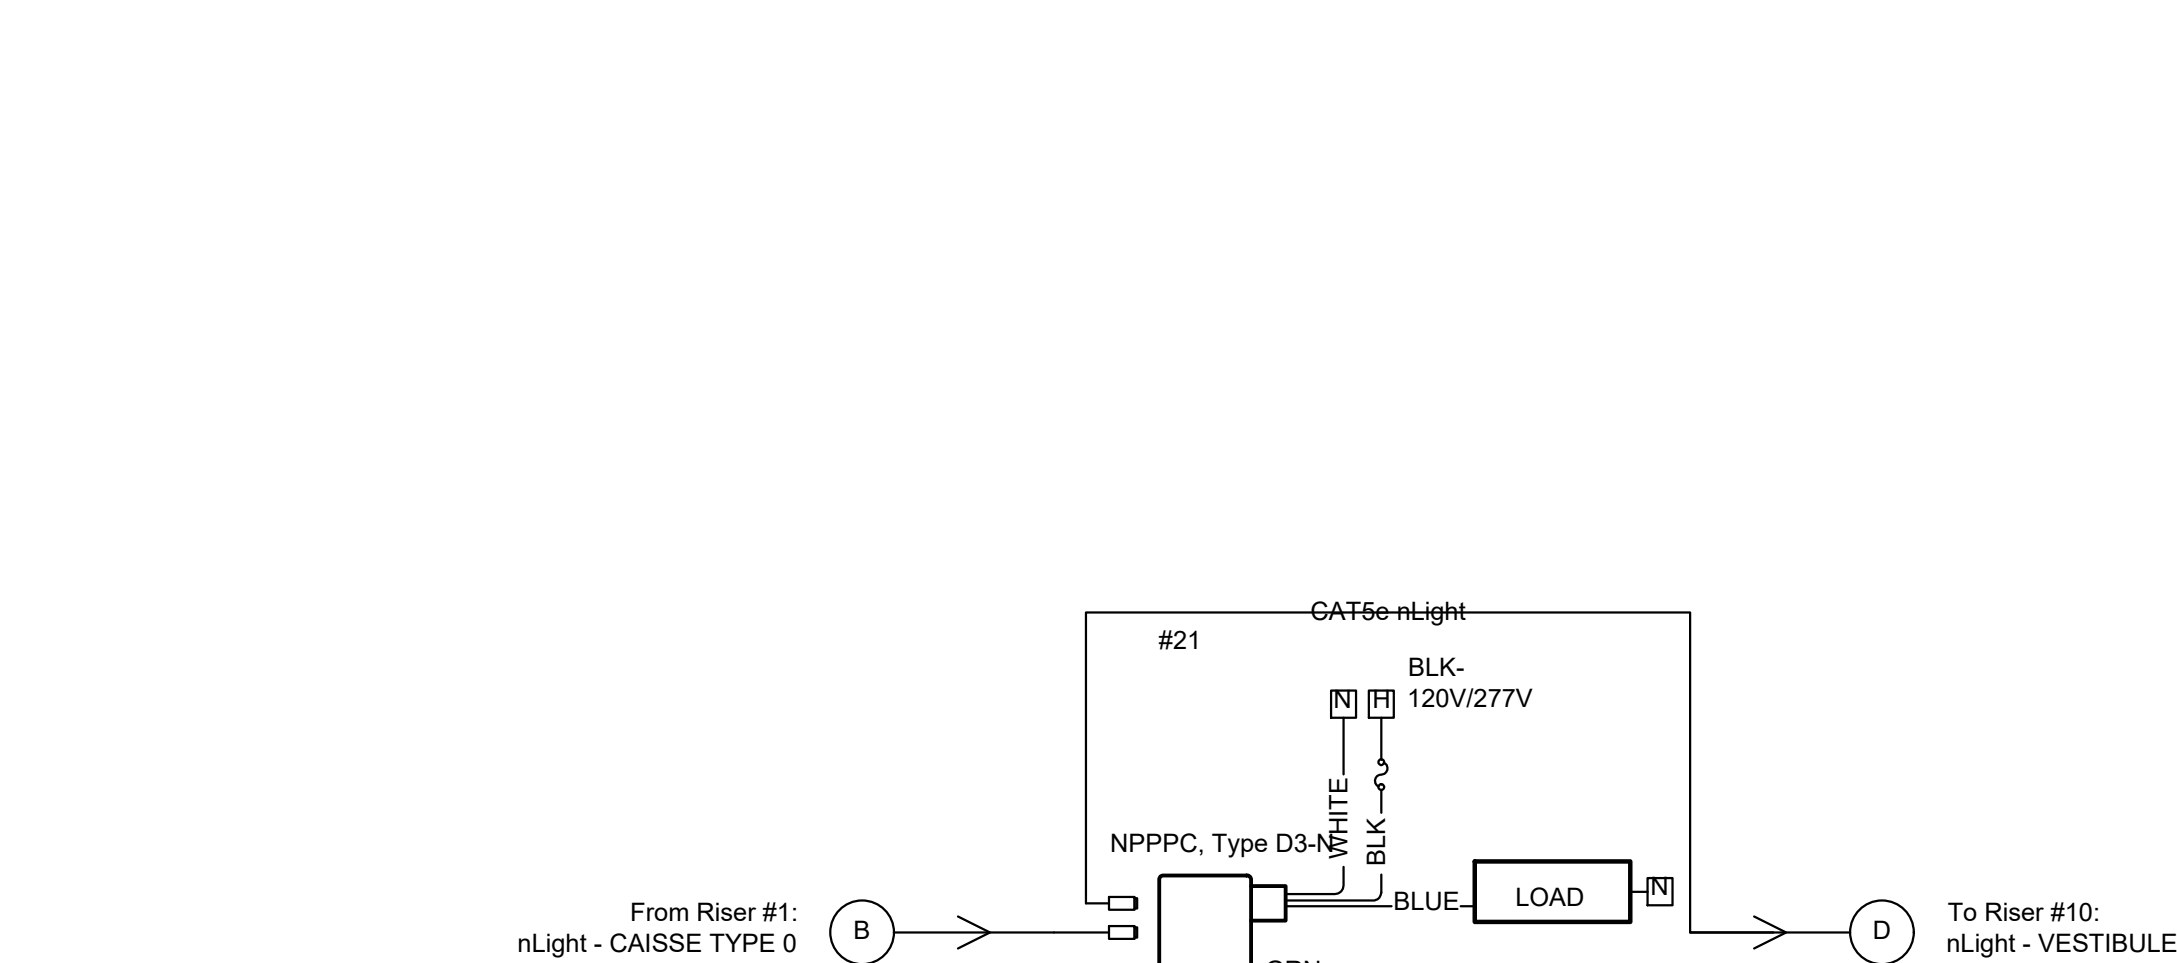

3 nLight - ENTREPOT
Design 2

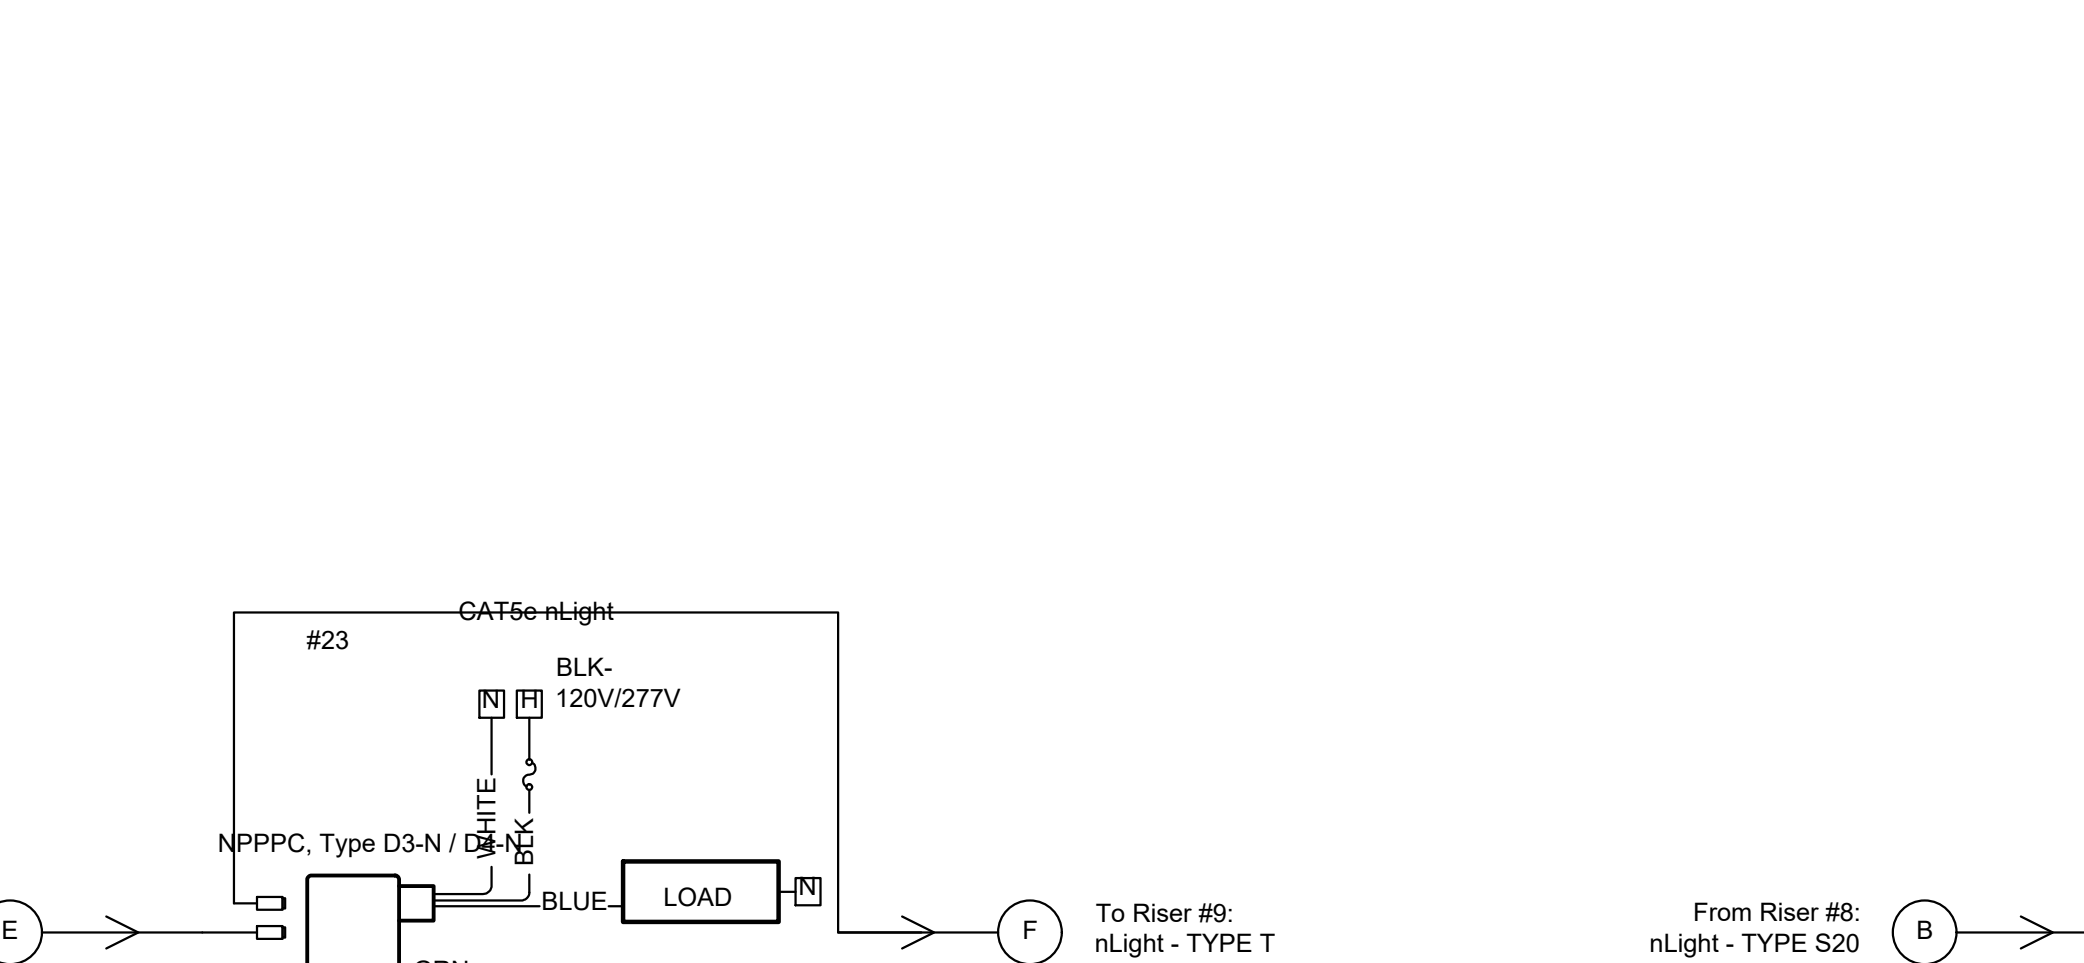


4 nLight - PRISE
Design 2

RELEVÉ E103 - MATERIEL 23 repères / 7 familles / RES 23
RES = Références des composants, modèles, prescriptions et réserves complètes page 2
RES = Références des composants, modèles, prescriptions et réserves complètes page 2


Matériel	Quantité	Matériel	Quantité	Matériel	Quantité	Matériel	Quantité	Matériel	Quantité
M01	1 / 88	M03	1 / 84	M05	1 / 84	M07	1 / 81		
M02	1 / 84	M04	1 / 84	M06	1 / 84				

QUANTITÉS SONT EN RÉFÉRENCE, VÉRIFIER LES QUANTITÉS RÉELLES.

8 nLight - TYPE S20
Design 2

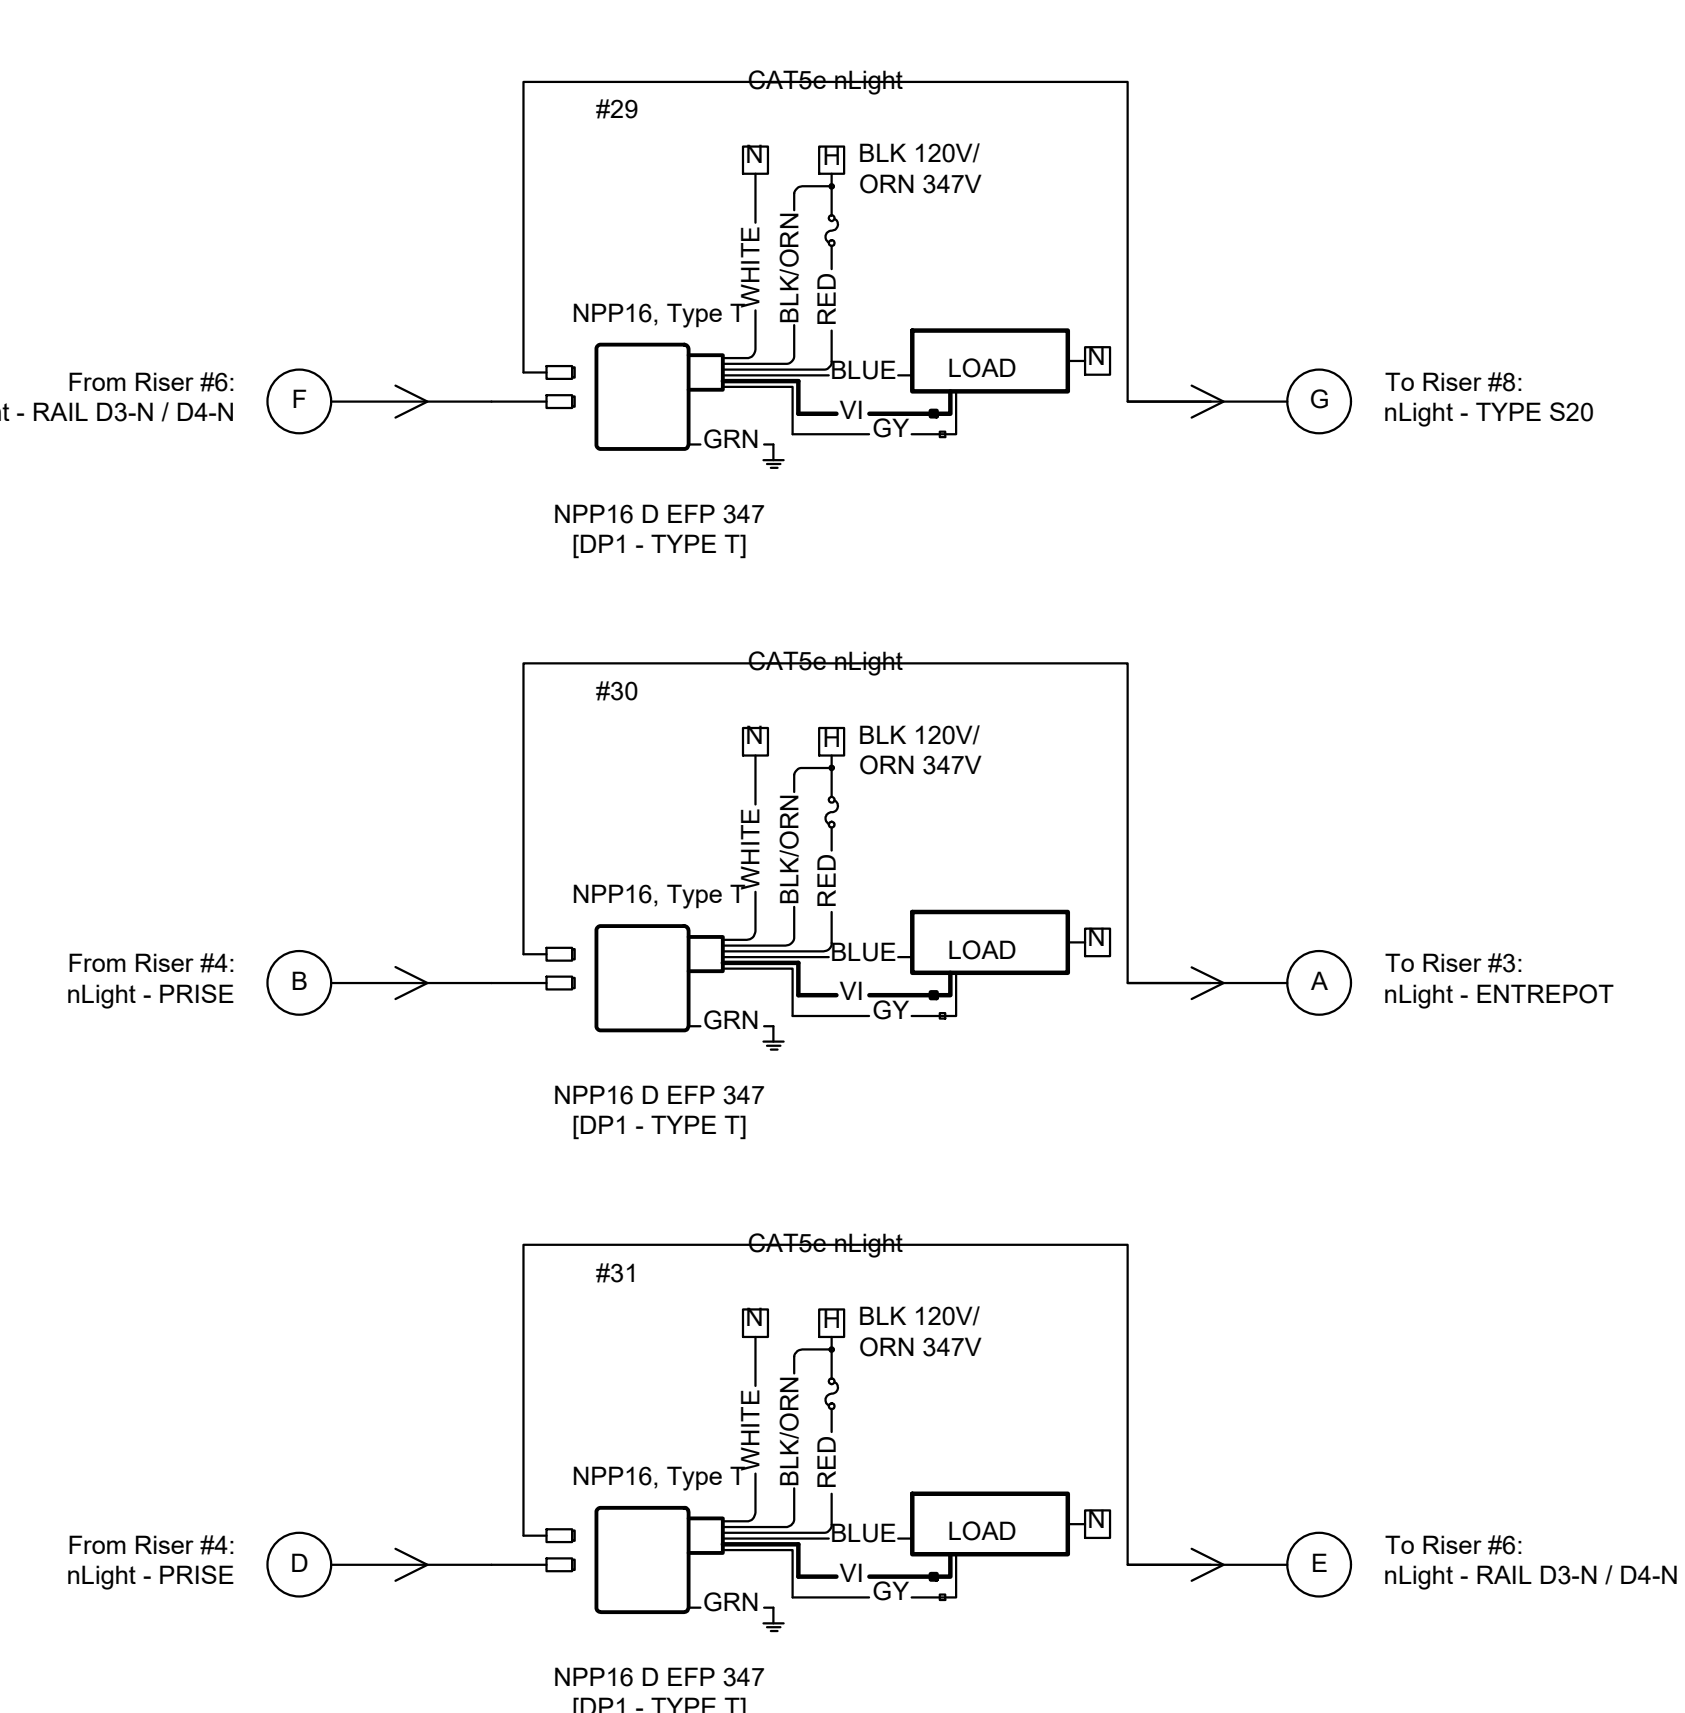


9 nLight - TYPE T
Design 2

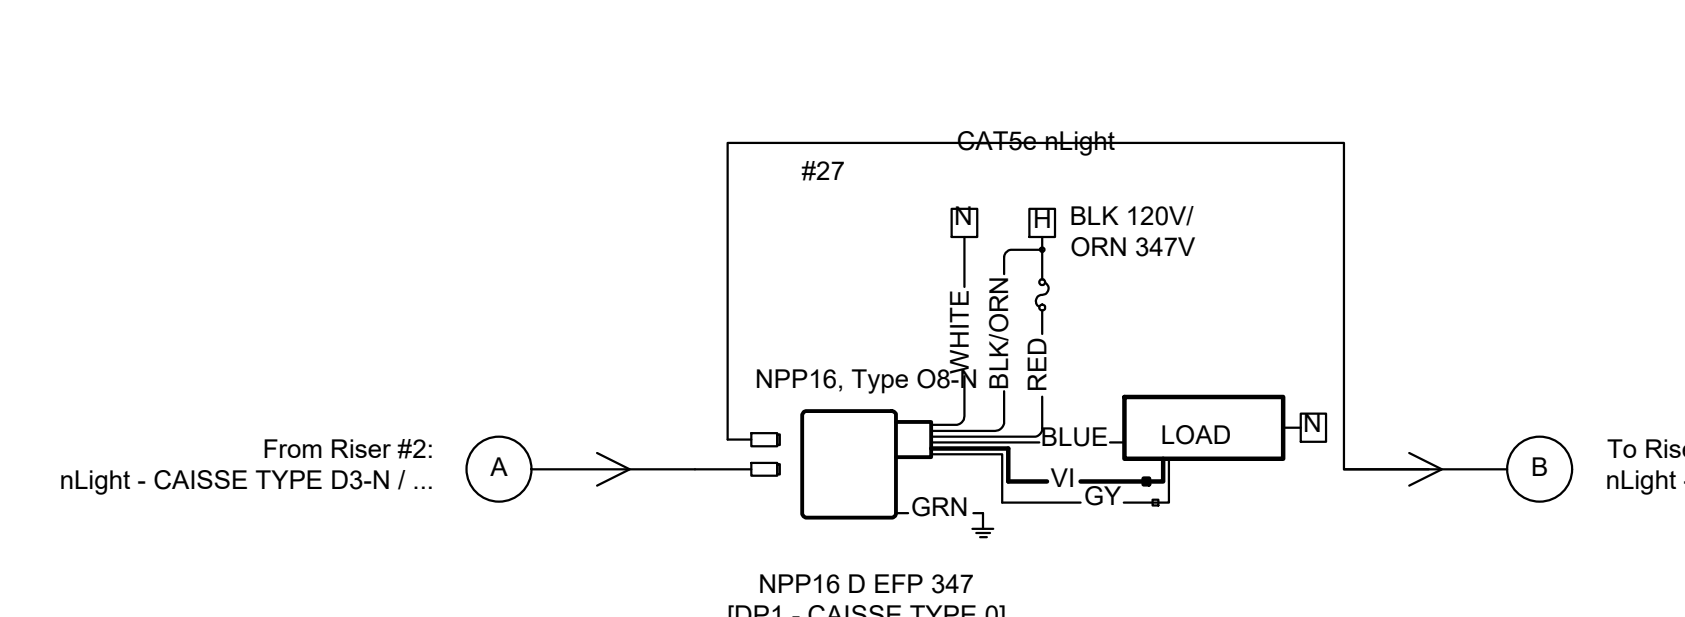


10 nLight - VESTIBULE
Design 2





5 nLight - RAIL
Design 2

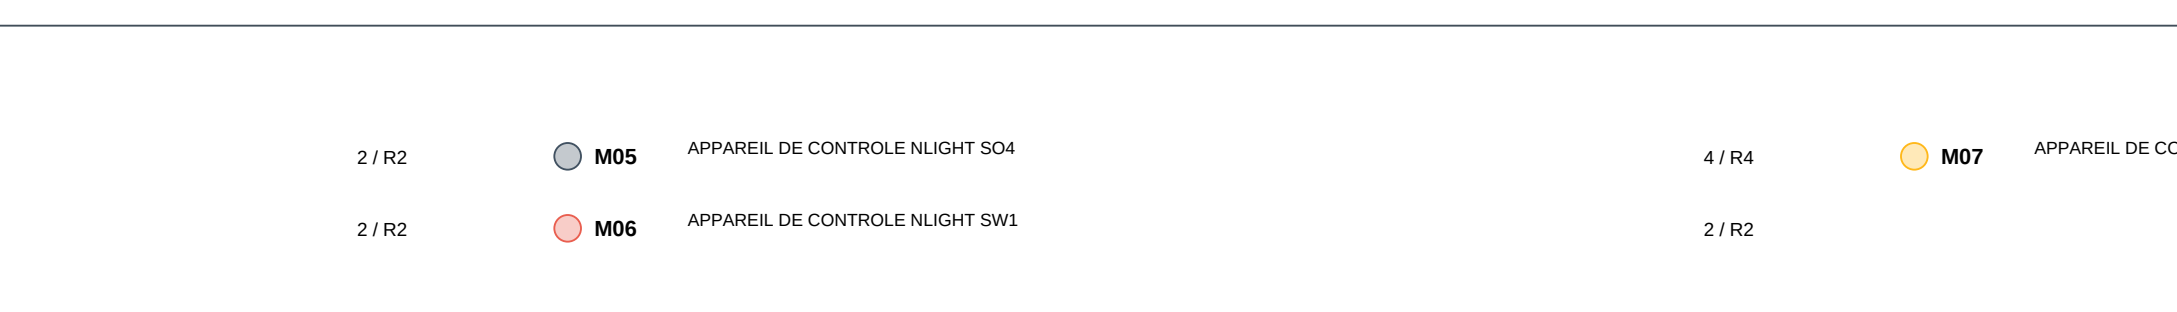


6 nLight - RAIL D3-N / D4-N
Design 2

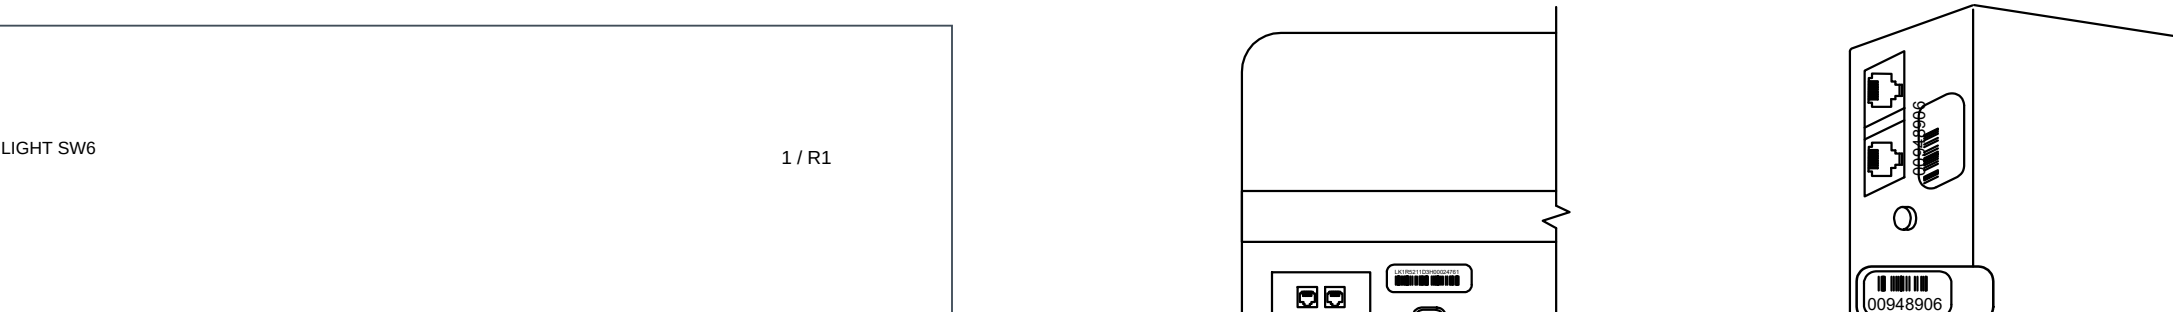

7 nLight - TYPE D3-N / D4-N
Design 2

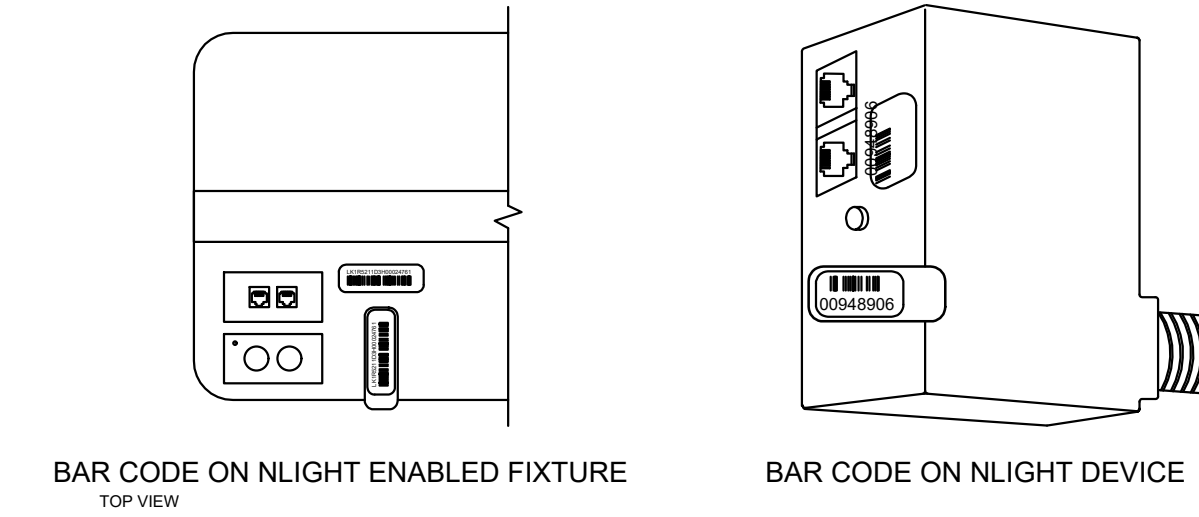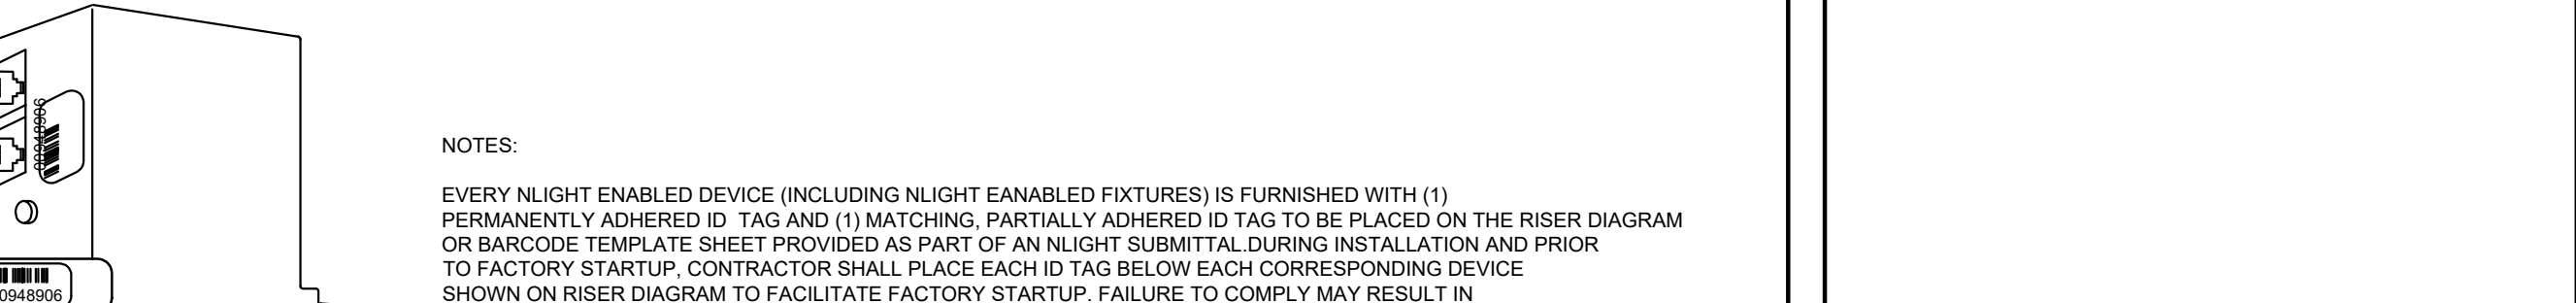

NOTES:
EVERY nLIGHT ENABLED DEVICE (INCLUDING nLIGHT ENABLED FIXTURES) IS FURNISHED WITH (1) PERMANENTLY ADHERED ID TAG AND (1) MATCHING PARTIALLY ADHERED ID TAG TO BE PLACED ON THE RISER DIAGRAM OR BARCODE TEMPLATE SHEET PROVIDED AS PART OF AN nLIGHT SUBMITTAL DURING INSTALLATION AND PRIOR TO FACTORY STARTUP. CONTRACTOR SHALL PLACE EACH ID TAG BELOW EACH CORRESPONDING DEVICE SHOWN ON RISER DIAGRAM TO FACILITATE FACTORY STARTUP. FAILURE TO COMPLY MAY RESULT IN STARTUP DELAYS AND ADDITIONAL COSTS AT THE CONTRACTOR'S EXPENSE. DO NOT PLACE DEVICE ID TAGS ON FLOOR PLAN UNLESS REQUIRED TO EXECUTE nLIGHT PLAN SERVICES. REFERENCE nLIGHT PLAN SERVICE NOTES ON THIS SHEET FOR SPECIFIC REQUIREMENTS.
THE SMALL BARCODE LABELS INCLUDED WITH ALL nLIGHT DEVICES AND nLIGHT ENABLED FIXTURES MUST BE PLACED ON A PRINTED PLAN SHEET BY THE INSTALLER PRIOR TO ONSITE SYSTEM STARTUP.
THE BARCODE INDICATES THE UNIQUE ID OF EACH nLIGHT DEVICE. THIS ID IS USED DURING SYSTEM STARTUP TO PROGRAM DEVICES WITH THE CORRECT GROUPINGS AND SETTINGS. WITHOUT THIS, SYSTEM STARTUP WILL REQUIRE ADDITIONAL DAYS ON THE JOB TO LOCATE DEVICE IDS.
BARCODE INSTRUCTIONS:
1. * PRINT A PLAN SHEET OF THE INSTALLATION AREA TO A MINIMUM D SIZE (24" X 36"). THE PLAN MAY BE A RISER SHEET OR BARCODE TEMPLATE (EITHER ARE PREFERRED). FLECTED CEILING PLAN, LIGHTING PLAN, AND ELECTRICAL PLAN. SO LONG AS ALL DEVICES CAN BE LOCATED BY THE FIELD SUPPORT ENGINEER.
2. PLACE THE SMALL BARCODE LABEL (0.875" LONG) FROM EACH LUMINAIRE AND DEVICE ON THE FLOORPLAN. THE LARGE BARCODE LABEL (1.25" LONG) CAN BE USED ON THE OUTSIDE OF ANY HOUSING OR JUNCTION BOX THAT OBSCURES THE ID NUMBER SHOWN ON THE DEVICE ITSELF.
3. SAVE THE PLAN AT THE JOB SITE, AND HAND OVER TO ACUTY FIELD SUPPORT ENGINEER OR OTHER PERSONNEL RESPONSIBLE FOR ONSITE SYSTEM STARTUP. IT IS ALSO ACCEPTABLE TO PROVIDE THE BARCODE PLAN AS SCANNED PDF FILES, EMAILED TO: CONTROLS.STARTUP@ACUTYBRANDS.COM, WITH PROJECT NAME AND PROJECT ADDRESS IN SUBJECT LINE AND A COPY OF THE ONSITE STARTUP REQUEST FORM.
4. DRAW ON PLAN ANY LOCATION CHANGES FOR A FIXTURE OR DEVICES, IF DIFFERENT THAN SHOWN ON PLAN.

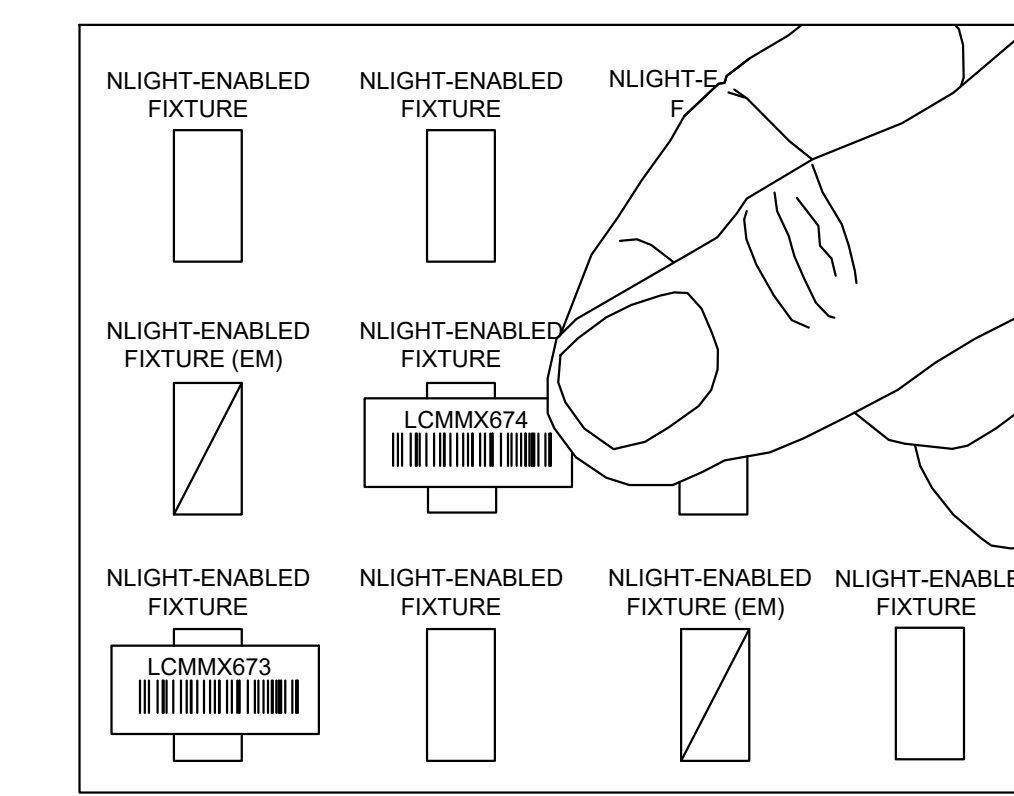

nLIGHT BARCODE INSTRUCTIONS

N.T.S.


TIA / EIA-568-B CABLEING STANDARD TERMINATION

Function	PAIR	PN OUT	Wire Color
(T1) 1	5	WHITE w BLUE	
(R1) 4	4	BLUE	
Tx + (T2) 2	1	WHITE w ORANGE	
Rx - (R3) 3	2	ORANGE	
Rx + (T3) 3	3	WHITE w GREEN	
(T4) 8	7	GREEN	
(R4) 8	6	WHITE w BROWN	
		BROWN	

TERMINATION & TESTING OF CAT5 CABLES MUST BE DONE BY A QUALIFIED NETWORK INSTALLER

- Cable termination requirements:
- Strip off outer jacket - approximately 1-1/2" (37.6 mm)
 - Terminate approximately 1/2" (12.2 mm) from end of conductors on type 110 punch down block or connector per schedule (568B) - maximum untwist of conductors to terminations is 1/2" (12.2 mm) - trim excess leads.

SEE SYSTEM SPECIFIC NOTES ON SHEET LC0.1 FOR MAXIMUM CABLE LENGTHS.

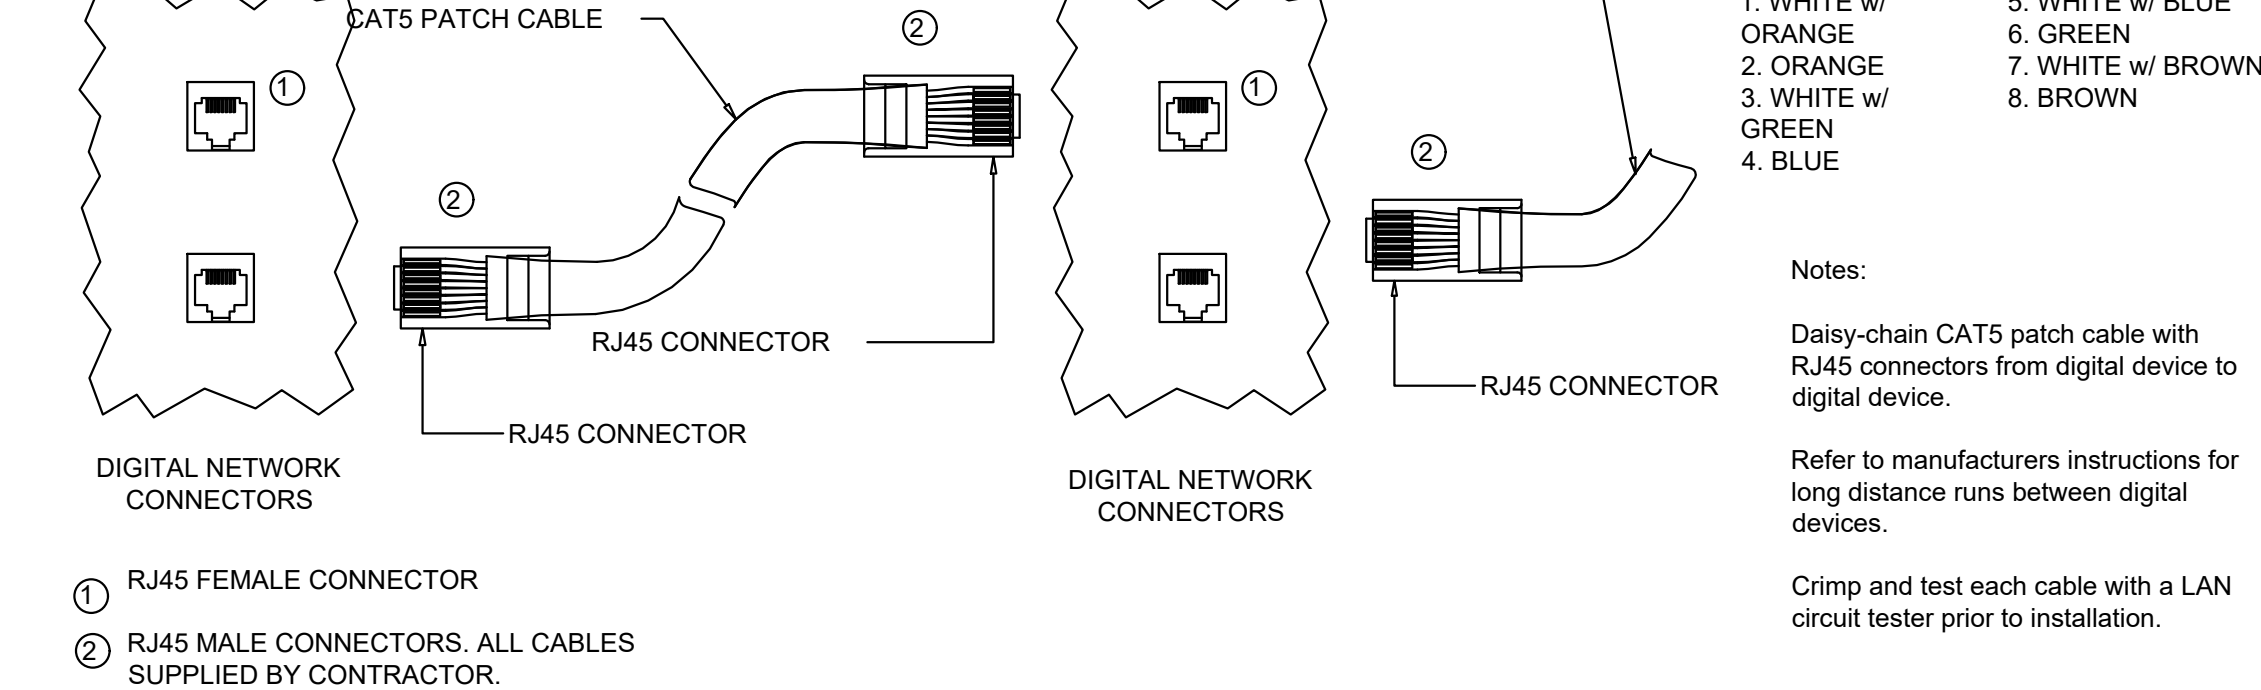

CAT5E/6 CABLE TERMINATION

N.T.S.

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

NO	DATE	REVISION	PAR
0	2026-08-26	POUR SOUMISSIONS	J.B.



TITRE DU PROJET
SAQ
SAQ VARENNES
VARENNES, QC, J3X 1P7

TITRE DU DESSIN
DÉTAILS
CONTRÔLE D'ÉCLAIRAGE

ÉLECTRIQUE	
CONQUÉER H. HATTAB, CPI	DATE (AAAA-MM-JJ) 2026-07-13
ÉVALUÉ PAR F. BELAND, tech.	ÉCHÉLLE AUCUNE
VÉRIFIÉ PAR J. BACHKONGI, ING.	NO DE PROJET 26-0094-02
APPROUVÉ PAR J. BACHKONGI, Ing.	PLAN NO E103

BORDEREAU MATERIEL - E103

Quantités representees avec multiplicateurs, portees et composants de chaque ensemble conserves.
Les renvois et composants de panneaux ne constituent pas des ensembles supplementaires a additionner.

Repere / source	Materiel	Designation	Qty	Portee	Modele	Prescription / reserve	Parent
M01-01 E103-002	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP1	DP1	1	INSTALLER	NPP16 D EFP 347	nLight NPP16 D EFP 347	
M01-02 E103-003	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP1	DP1	1	INSTALLER	NPP16 D EFP 347	nLight NPP16 D EFP 347	
M01-03 E103-004	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP1	DP1	1	INSTALLER	NPP16 D EFP 347	nLight NPP16 D EFP 347	
M01-04 E103-006	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP1	DP1	1	INSTALLER	NPP16 D EFP 347	nLight NPP16 D EFP 347	
M01-05 E103-009	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP1	DP1	1	INSTALLER	NPP16 D EFP 347	nLight NPP16 D EFP 347	
M01-06 E103-013	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP1	DP1	1	INSTALLER	NPP16 D EFP 347	nLight NPP16 D EFP 347	
M01-07 E103-017	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP1	DP1	1	INSTALLER	NPP16 D EFP 347	nLight NPP16 D EFP 347	
M01-08 E103-020	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP1	DP1	1	INSTALLER	NPP16 D EFP 347	nLight NPP16 D EFP 347	
M02-01 E103-006	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP2	DP2	1	INSTALLER	NPP PCD EFP	nLight NPP PCD EFP	
M02-02 E103-007	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP2	DP2	1	INSTALLER	NPP PCD EFP	nLight NPP PCD EFP	
M02-03 E103-014	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP2	DP2	1	INSTALLER	NPP PCD EFP	nLight NPP PCD EFP	
M02-04 E103-023	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT DP2	DP2	1	INSTALLER	NPP PCD EFP	nLight NPP PCD EFP	
M03-01 E103-005	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT PP1	PP1	1	INSTALLER	NPP20 PL BP	nLight NPP20 PL BP	
M03-02 E103-012	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT PP1	PP1	1	INSTALLER	NPP20 PL BP	nLight NPP20 PL BP	
M04-01 E103-015	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT SO3	SO3	1	INSTALLER	WSXA MWO PDT D WH	nLight WSXA MWO PDT D WH	
M04-02 E103-019	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT SO3	SO3	1	INSTALLER	WSXA MWO PDT D WH	nLight WSXA MWO PDT D WH	
M05-01 E103-001	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT SO4	SO4	1	INSTALLER	WSXA MWO PDT WH	nLight WSXA MWO PDT WH	
M05-02 E103-016	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT SO4	SO4	1	INSTALLER	WSXA MWO PDT WH	nLight WSXA MWO PDT WH	
M05-03 E103-018	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT SO4	SO4	1	INSTALLER	WSXA MWO PDT WH	nLight WSXA MWO PDT WH	
M05-04 E103-021	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT SO4	SO4	1	INSTALLER	WSXA MWO PDT WH	nLight WSXA MWO PDT WH	
M06-01 E103-010	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT SW1	SW1	1	INSTALLER	NPODMA WH	nLight NPODMA WH	
M06-02 E103-011	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT SW1	SW1	1	INSTALLER	NPODMA WH	nLight NPODMA WH	
M07-01 E103-022	APPAREIL DE CONTROLE NLIGHT SW6	SW6	1	INSTALLER	NPOD TOUCH WH	nLight NPOD TOUCH WH	

RESERVES ET COMPLEMENTES
R-001 E103 PS 150 (bloc d'alimentation du NPOD TOUCH) vu au riser 2 seulement, pas de symbole au plan. Compteur PS 150 - a confirmer , sans quantite posee (5b).
R-002 E103 Cable CAT5e nLight : lineaire, echelle AUCUNE a metre sur la feuille d'eclairage a l'echelle (5b).
R-003 E103 Connecteurs RJ45 / terminaisons CAT5e : quantite par regle a fixer (2 par segment , cables fournis par l'entrepreneur selon la note) (5d).
R-004 E103 Symbole SN du fond raster (9 vus, non complexes) : hors perimetre (decision du superviseur) SN - a classer , sans quantite.
R-005 E103 Boles raster de l'ingenieur NPP16 / NSP5 / NPP20 / WSXA / WSXA-G / NPOD / NPODMA et de P4 (se referer aux plans des ingenieurs pour la quantite de relais) : hors perimetre, non complexes ; NSP5 n'a aucune etiquette vectorielle.
R-006 E103 #16 (DP2) : texte NPP16, Type D3-N / D4-N mais commande NPP PCD EFP ; annotation POURQUOI NPP16? , Compte DP2 : NPP PCD EFP ; modele a confirmer.
R-007 E103 Riser 10 VESTIBULE recopie #27 (Type O8-N) : au plan le vestibule porte #28 (Type B-B). #27 compte une seule fois au plan , erreur de dessin probable du riser 10.
R-008 E103 Numerotation #13 a #37 seulement ; #1, #12, #14, #15 absents feuille(s) non recue(s). Note SEE SYSTEM SPECIFIC NOTES ON SHEET LCO.1 , LCO.1 non recue.
R-009 E103 Detecteurs SO3/SO4 (#17, #18, #24, #25, #26, #37) absents des risers : types par l'etiquette du plan seulement, #26 sert un Type G3 (des autres G4) : meme modele meme famille.
R-010 E103 DP1 : un seul compteur par modele (NPP16 D EFP 347) : le type servi (O8-N, B-B, T, S20N 24H, S20-N, P1/P2) est une zone, pas une caracteristique du bloc (R1/S6).
R-011 E103 Eclairant (EC) : plafond gypse existant, aerotherme (EC) : non releves. Chauffe-eau change par bailleur (hors-contrat) : fourni par autres, non chiffre.
R-012 E103 Luminaires du fond raster (D3-N, D4-N, S20-N, O8-N, T, B-B, P1/P2, J1, G3/G4...) et annotations SEPARER CE RAIL , RAIL SEUL , 3 luminaires (moins... : hors feuille de controle, non releves ici.
